


FICHE D'OUVRAGE TUNNEL 1 DU CANAL DE LA SIAGNE TUNNEL de la Foux

Commune : Saint-Cézaire sur Siagne


Date d'inspection : 09 mars 2021 Tunnel inspecté par :


- Monsieur COMTE (SICASIL)
- Monsieur EMILY (H2EA)

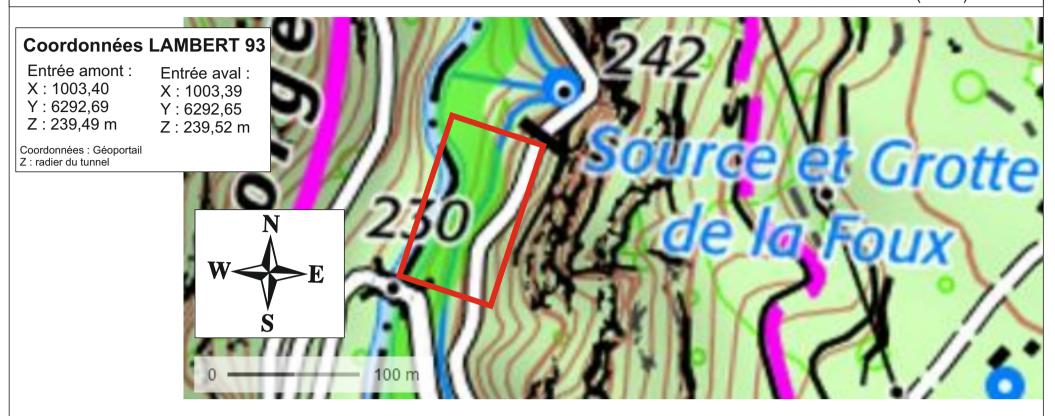


Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 58,82 m de long en contrebas de la route menant à l'usine hydroélectrique. La voûte de ce tunnel est constituée de calcaires fissurés sur laquelle on observe des stalactites (Cf. schémas, photo).






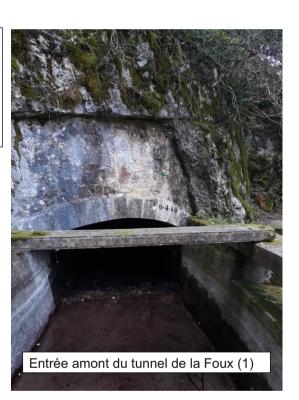

Etat général de l'ouvrage

Tunnel en assez bon état le 09/03/2021.

De petites stalactites sont visibles dans les calcaires de la voûte ce qui semble indiquer quelques intrants en période pluvieuse.



Risque d'intrant
Risque très faible voire nul
Risque moyen
Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage		
	Faible voire nulle	
	Moyenne	
	Forte	

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.
